

What is Risk?

Risk = Potential Problem

Why Do We Manage Risk?

Project problems can be reduced as much as 90% by using risk analysis

- *Positives:*

- More info available during planning
- Improved probability of success

- *Negatives:*

- Belief that all risks are accounted for
- Project cut due to risk level

Risk management = Proactive strategy
(*Flertal* = *Risici*)

Risk Categories

- Technical
- Business
- Project

RMMM (Risk Mitigation, Monitoring and Management):

Risk mitigation


Proactive planning for Risk Avoidance

Risk monitoring

Continually monitor risks to identify any change in the status

Risk Management

Contingency planning = Actions to be taken in the event that mitigation steps have failed

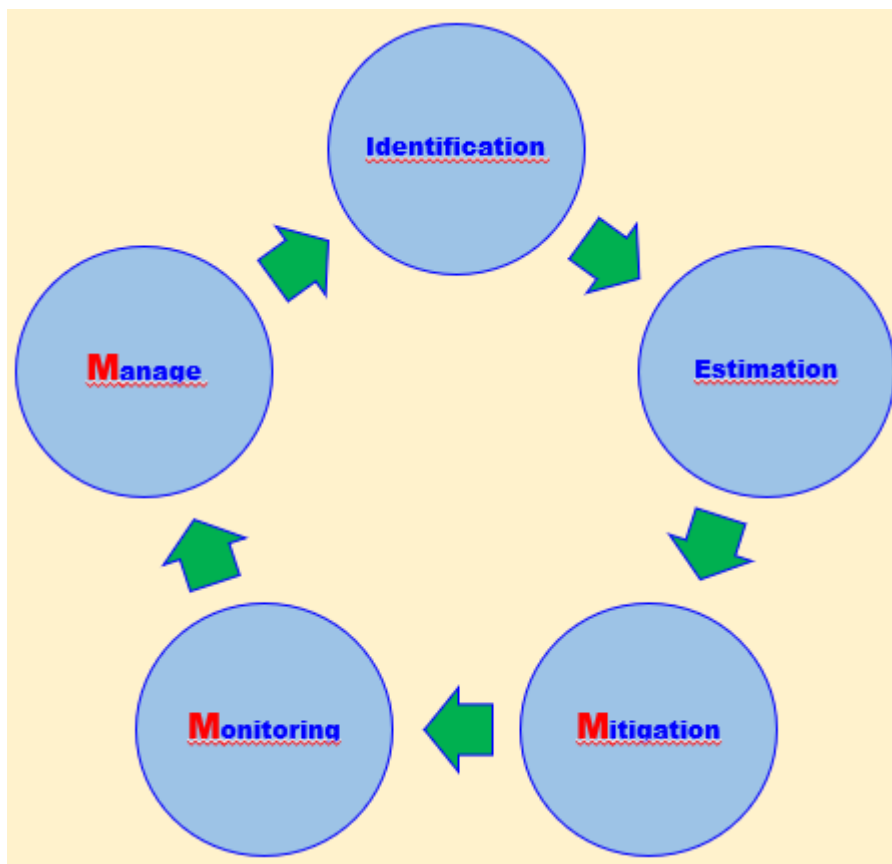

Beregning af Risici:

$$S * K = P$$

Sandsynligheden for at en given risiko intræder

Konsekvensen hvis en given risiko indtræder

Produkt = Størrelsen / prioriteringen af en given risiko

Risikoanalyse tabel			
Risikomoment	Sandsynlighed	Konsekvens	Produkt
Nøgleprojektdeltagere forlader projektet	2 S	7 K	14 P
Fatale fejlestimer	1	10	10

*Husk at opgive skala for henholdsvis **S**(1 – 5) og **K**(1-10).

Planlægning af Risici:

For hver Risiko, definér:

- **Præventive Tiltag**

Hvordan sikre vi, at risikoen ikke intræder?

(Og ansvarlig for dette -> Person/rolle, IKKE "Gruppen" Etc.)

- **Løsningsforslag**

Hvis vi er havnet i situationen, hvordan kommer vi bedst videre herfra?

(Og ansvarlig for dette -> Person/rolle, IKKE "Gruppen" Etc.)

- **Omkostning (Ressource)** (Udover pensum!)

Det kan være relevant at, hvis en risiko indtræder, at liste omkostningen for løsningsforslag. Altså... Hvis vi skal have noget xtra.. Hvor mange timer skal der bruges på dette!

Udvidet risikotabel for IT-udviklingsprojekt							
Risiko-moment	Sandsyn-lighed	Konse-kvens	Pro-dukt	Præventive tiltag	Ansvarlig	Løsning forslag	Ansvarlig
Nøgle projektdeltagere forlader projektet	2	7	14	Sikre at der er et godt arbejdsmiljø i projektgruppen, sikre at mindst to projektdeltagere arbejder på løsning af samme opgave.	Projektlederen og projektdeltagerne.	Hvis projektdeltagere forlader projektet, er der allerede lavet en aftale om hvem og hvordan nye projektdeltagere skal komme ind i projektet.	Projektlederen og projektdeltagerne.
Fatale fejlestimer.	1	10	10	Gennemgå alle estimer to gange og lade en ekstern kyndig person	Projektleder	Der er indgået en aftale med styregruppen om ekstrabevillinger i tilfælde af fatale	Projektlederen og styre-

Omkostning (Ressource)

Xtra kolonne
